

2ª MEDIÇÃO (Setembro 2019)

Item	Descrição	Valor a Executar R\$	% Executado	Valor Executado R\$	% do mês	% Rel
1	SERV. PRELIMINARES GERAIS	1.969,73	100	1969,73	1,32	1,32
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	1.300,31	100	1300,31	0,87	0,87
3	FUNDAÇÃO	7.828,41	100	7828,41	5,25	5,25
4	ESTRUTURA	12.354,78	40	4941,91	3,31	8,28
5	ALVENARIA	13.422,67	40	5369,07	3,60	9,00
6	LAJE	11.537,36	20	2307,47	1,55	7,74
7	ESCADA	2.810,20	0	0,00	0,00	1,88
8	REVESTIMENTO INTERNO	5.321,37	0	0,00	0,00	3,57
9	REVESTIMENTO EXTERNO	7.757,11	0	0,00	0,00	5,20
10	PISO	6.582,97	0	0,00	0,00	4,41
11	COBERTURA	4.704,69	0	0,00	0,00	3,15
12	ESQUADRIAS	4.698,59	0	0,00	0,00	3,15
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.689,19	0	0,00	0,00	1,80
14	PINTURA	7.888,57	0	0,00	0,00	5,29
15	LIMPEZA FINAL	534,07	0	0,00	0,00	0,36
		91.400,02		23716,90	15,90	61,29

Data: 13/09/2019

GALBA PEREIRA DE ASSIS
CREA 131327/D

Eng. Civil

Responsável Técnico da Contratada

CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
CONTRATANTE

PATRICIA LAMBERT MOREIRA

CAU/MG 41.745-9

Arquiteta e Urbanista

Responsável Técnico pela fiscalização
por parte da Contratante

OBS.: Serviços executado da Obra: Ampliação da Câmara Municipal de Inconfidentes

1ª medição + 15.993,88 em 23/08/19
2ª medição + 23.716,90 em 13/09/19
7.723,02

2ª MEDIÇÃO – 13/09/2019

Figuras 1 e 2 – DEMOLIÇÃO (interior da parte já existente)



Figuras 3 a 7 - ESTRUTURA e ALVENARIA



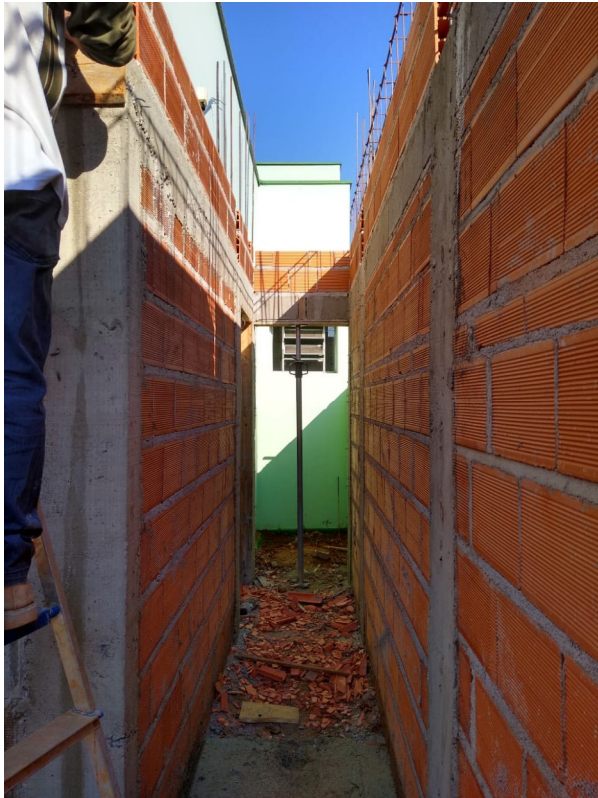


Figura 8 – CONTRAPISO



Figuras 9 a 13 – LAJE

